



Všeobecné upozornenie!!!

ZMLUVA O DIELO č. 10/2019

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa:

na uskutočnenie stavebných prác s názvom:
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Nad Hrádzou, Nová Baňa“

(ďalej iba „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Technické služby mesta Nová Baňa

Sídlo :

Dlhá lúka 18, 968 26 Nová Baňa

Štatutárny orgán:

František Bakoš, riaditeľ

IČO :

00 185 221

DIČ:

20211113454

IČDPH:

SK20211113454

Bankové spojenie :

Všeobecná úverová banka, a.s., pob. Nová Baňa

Číslo účtu :

SK38 0200 0000 0000 1123 6422

Telefón/ fax :

045 685 6003

Email:

tsnb.riaditel@gmail.com

Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:

František Bakoš

Osoby oprávnené jednať
v realizačných veciach:

František Bakoš, riaditeľ

Telefón/ fax :

+421 905 964 483

Email:

tsnb.riaditel@gmail.com

(ďalej iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:

EUROVIA SK, a.s.

Sídlo:

Osloboditeľov 66, Košice 040 17

Štatutárny orgán:

Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Juraj Dančíšín – člen predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.

Právna forma:

akciová spoločnosť

IČO:

31 651 518

DIČ:

2020490274

IČ DPH:

SK2020490274

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava 832 37

Číslo účtu:

SK7009000000005025284727

Telefón/fax:

Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred, +421 908 714 098

Email:

milos.farkas@eurovia.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Objednávateľ zrealizoval verejné obstarávanie s predmetom „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Nad Hrádzou, Nová Baňa**“, ktoré bolo vyhlásené výzvou na predkladanie ponúk v zmysle ust. §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO. Dňa 8.7.2019 sa Zhotoviteľ stal úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní, identifikovanom v predošlej vete a táto zmluva je uzavretá na základe výsledku predmetného verejného obstarávania.

I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je výlučným vlastníkom miestnej komunikácie, ktorá je ako predmet Zmluvy definovaná v článku III. Zmluvy a **Prílohe č. 1** k Zmluve (ďalej len „Stavenisko“ alebo „Stavba“). **Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.**
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie Diela v zmysle na predmet Zmluvy sa vzťahujúcich platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, spĺňa podmienky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je oprávnený túto Zmluvu uzavrieť a naplniť účel Zmluvy.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nie je subjektom verejnej správy a zároveň, na základe tejto Zmluvy prijíma alebo bude prijímať finančné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a/ bod 1. tohto zákona, preto, ak spĺňa podmienky na zápis do registra partnerov verejného sektora ako účastník Zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d/ tohto zákona a k času podpisu Zmluvy nezabezpečil svoj zápis do registra podľa tohto zákona, Objednávateľ ako účastník Zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a/ prvého bodu tohto zákona nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá táto Zmluva, pričom Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez nároku Zhotoviteľa na plnenie titulom ceny Diela.
4. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na verejné obstarávanie a na vykonanie Diela, a to najmä predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že predložil objednávateľovi najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy:
 - **Záväzný časový a vecný Harmonogram prác** schválený objednávateľom
(Príloha č. 2 Zmluvy),
 - **Zoznam všetkých subdodávateľov** s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, osôb oprávnených konať za subdodávateľa, s preukázaním oprávnenia subdodávateľa na príslušné plnenie Zmluvy, predmetu – rozsahu subdodávky,
(Príloha č. 3 Zmluvy),
 - **Doklady preukazujúce splnenie podmienok na výkon funkcie stavbyvedúceho**

- Zoznam všetkých výrobní asfaltových zmesí, ktorých výrobky (asfaltové zmesi) použije zhotoviteľ na realizáciu predmetu zákazky,
- Kontrolný súšobný plán – merania požadovaných štandardov pre zhutnenie podkladových materiálov
- Aktuálne, platné certifikáty, vyhlásenia o zhode vlastností a atesty zapudovaných materiálov, protokoly o vykonaných skúškach podľa kontrolného skúšobného plánu, najmä skúšky všetkých asfaltových zmesí vyžadovaných na realizáciu predmetu zmluvy, odobratých vo výrobní v súlade s STN EN 13108-21, STN EN 13108-20
- **Potvrdenie o uzavretí poisťných zmlúv** platných po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy, **(Príloha č. 4 Zmluvy)**
- **Záručná listina - doklad preukazujúci poskytnutie Bankovej záruky**, v prospech objednávateľa alebo doklad preukazujúci zloženie garančnej zábezpeky na účet objednávateľa podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve

(Príloha č. 5 Zmluvy)

6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii Diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby Dielo, resp. jeho časť realizoval sám. Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť objednávateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa subdodávok.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil, do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na vykonanie kontrolných meraní miery zhutnenia podkladových materiálov v jednotlivých fázach výstavby, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou Diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má Dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu Diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie Diela.

II.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným vo výkazoch výmer tvoriacich **Prílohu č. 1** k Zmluve, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať Dielo vymedzené v článku III. Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.
2. Objávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané Dielo prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň Cenu dohodnutú v článku VII. Zmluvy.

III.

Členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác vrchnej stavby miestnej

komunikácie:

- Ulica Nad Hrádzou, Nová Baňa, v rozsahu a spôsobom podľa výkazu uvedeného v Prílohe č. 1 Zmluvy

2. **Príloha č. 1** tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
3. Ak sa v tejto Zmluve používa pojem Dielo, myslí sa tým miestna komunikácia ako celá vymedzená v článku III. ods. 1 Zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k Dielu, STN, STN EN, KL a VL MDPT SR, TP a TKP MDVRR SR časť 6 – Hutné asfaltové zmesi účinnosť od 15.05.2015, KLAZ 1/2010 Katalógové listy asfaltových zmesí, MDPT SR: 2010, Dodatok č. 1 ku KLAZ 1/2010, MDVRR SR: 2015; KKL 1/2012 Katalógové listy kameniva, MDVRR SR: 2012; KLA 1/2014 Katalógové listy asfaltov, MDVRR SR: 2014; KLEaZ 1/2014 Katalógové listy emulzií a zálievok, MDVRR SR: 2014, TP MDPT SR č. 2/2009 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí, (k dispozícii na www.ssc.sk), technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania Diela a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.
6. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktné dodržiavať ustanovenia najmä stavebného zákona, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že všetky osoby podieľajúce sa na zhotovovaní Diela preukázateľne disponujú dokladmi preukazujúcimi: a/ absolvovanie predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej bezpečnosti, b/ predpismi vyžadovaný zdravotný stav pre vykonávanie činnosti a c/ spôsobilosť na výkon vybraných činností. Zhotoviteľ je ďalej povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom Zhotoviteľ je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté stavebnými prácami na vlastné náklady a spôsob likvidácie odpadu je zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať príslušnými potvrdeniami. Zhotoviteľ je ďalej povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.04.2018. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávani. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávani zo strany zhotoviteľa a iných právnych predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, najmä vyplývajúcich z čl. III. bod 6, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.

7. Objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonáva stavebný dozor (v súlade s § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Za týmto účelom má prístup na Stavenisko. Stavebný dozor nariaďuje a zúčastňuje sa kontrolných dní na Stavbe. Termíny a podmienky kontrolných dní dohodnú zmluvné strany písomne v Protokole o odovzdaní Staveniska. Stavebný dozor je oprávnený na náklady zhotoviteľa, na Stavenisku, počas zhotovovania Diela, odobrať alebo vyžiadať vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality - atesty a akékoľvek iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy za účelom kontroly a overenia plnenia povinnosti zhotoviteľa zhotovovať Dielo riadne. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať kvalitu a harmonogram vykonávania diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ ihneď odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela na vlastné náklady a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej lehote, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, ide o podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak zmluvné strany nedoohodnú písomne iný postup.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania Staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
 - Stavebné povolenie pre stavebné úpravy na príslušnom špeciálnom stavebnom úrade,
 - určenie dočasného dopravného značenia,
 - odovzdanie jednotlivých začiatkov a koncov vybratých úsekov podľa **prílohy č. 1** tejto Zmluvy,
9. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie aj v iných prípadoch, na písomnú odôvodnenú žiadosť zhotoviteľa, v lehote písomne dohodnutej zmluvnými stranami v stavebnom denníku.
10. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný formou zápisov v stavebnom denníku, kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými prostriedkami dohodnutými písomnou formou.
11. Objednávateľ doručí zhotoviteľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením ich kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva/poverenia.
12. Stavbyvedúci zhotoviteľa je povinný o.i. zákonných povinností viesť na Stavenisku dokumentáciu:
 - a) stavebný denník
 - b) doklady o spôsobilosti pracovníkov,
 - c) kópiu dokladu, že pracovníci zhotoviteľa na stavbe sú v pracovnom alebo inom zmluvnom pomere k zhotoviteľovi,
 - d) knihu úrazov,
 - e) záznamy o školení pracovníkov.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zápisom do stavebného denníka a súčasne ústne alebo písomne vyzve objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú

neprístupnými a to minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ aj napriek zhotoviteľa nedostaví na stavenisko, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v stavebných prácach, pričom, objednávateľ je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia a prípadné následky s tým spojené. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli vykonané riadne, všetky náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.

14. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie Diela, ak zhotoviteľ mal a/alebo mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti, starostlivosti a maximálneho úsilia. Stavebný dozor objednávateľa nie je oprávnený zasahovať do činnosti zhotoviteľa, predovšetkým do spôsobu riadenia zhotoviteľa pri realizácii Diela, okrem prípadu, že stavbyvedúci/jeho zástupca zhotoviteľa nie je včas dosiahnuteľný a je ohrozená bezpečnosť realizovaného Diela, život alebo zdravie na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne škody. Stavebný dozor je oprávnený za splnenia podmienky podľa predchádzajúceho ods. dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz ihneď prerušiť prácu.
15. Zhotoviteľ je zodpovedný za presné dodržanie polohy začiatku a konca vybratých úsekov ciest (tvoriacich predmet Zmluvy) pri zhotovovaní Diela. Kontrola vytýčenia začiatku a konca vybratých úsekov ciest vykonaná objednávateľom počas zhotovovania Diela nezbujuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť dodržiavania vytýčenia. Začiatky a konce vybratých úsekov ciest (tvoriacich predmetu Zmluvy) sú pre zhotoviteľa záväzné.
16. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov verejnej moci vydaných pred začatím a počas realizácie Diela. Ak príslušný orgán verejnej moci uloží objednávateľovi akúkoľvek sankciu za porušenie alebo neplnenia povinností zhotoviteľom, objednávateľ má regresný nárok proti zhotoviteľovi v plnom rozsahu.

IV.

Stavenisko a podmienky prevzatia staveniska

1. Staveniskom je priestor vybratých úsekov ciest tvoriacich predmet Zmluvy, ktorý je počas realizácie Diela určený na vykonávanie stavebných prác, na uskladňovanie stavebných výrobkov, materiálov, dopravných a iných zariadení a strojov potrebných na vykonanie Diela.
2. Zhotoviteľ je povinný, na základe výzvy objednávateľa prevziať Stavenisko v deň určený objednávateľom vo výzve. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoví zhotoviteľ Záznam/zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanú splnomocnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Odo dňa odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou Diela bez zbytočného odkladu po prevzatí Staveniska.
5. Zhotoviteľ je povinný Stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
6. Zhotoviteľ sa povinný:
 - zabezpečiť Stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu zo Staveniska,
 - zabezpečiť a dodržiavať poriadok a čistotou a bezpečné uloženie stavebných výrobkov, materiálov a stavebných mechanizmov a zariadení na Stavenisku,
 - zaistiť bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - zabezpečiť odvoz alebo likvidáciu odpadu stavby,
 - chrániť majetok objednávateľa pred poškodením alebo zničením.
 - organizovať, riadiť, koordinovať a niesť zodpovednosť za stavebné práce a iné činnosti na Stavenisku pri realizácii Diela,

- sledovať spôsob a postup realizácie Diela tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na Stavenisku, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení.
7. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na Stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami.
 8. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.
 9. Zhotoviteľ predložil objednávateľovi najneskôr pri podpise tejto zmluvy:
 - počiatočnú skúšku typu (STN EN13108-20) na všetky asfaltové zmesi použité na vybrané úseky ciest,
 - kontrolný súšobný plán v zmysle štandardov ne zhutnenie podkladových materiálov požadových objednávateľom.

Predmetné dokumenty sú prílohou tejto Zmluvy.

V.

Stavebný denník, Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

Stavebný denník:

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v origináli a v dvoch kópiách (rovnopisoch). Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšia kópia stavebného denníka je určená pre stavebný dozor.
2. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade so stavebným zákonom, vykonávacími predpismi. Stavebný denník musí obsahovať všetky potrebné údaje a skutočnosti, ktoré sú spôsobilé preukázať a overiť dodržiavanie povinností zhotoviteľa. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný pre oprávnené osoby. Povinnosť viesť stavebný denník (ďalej len „SD“) končí dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela objednávateľom.
3. Minimálny rozsah denného zápisu v SD dohodli zmluvné strany nasledovne:
 - dátum (deň, mesiac, rok),
 - presné označenie vybraného úseku stavby, na ktorej sa stavebné práce vykonávajú,
 - klimatické podmienky a pomery, maximálna a minimálna teplota vzduchu pri začiatku, počas a pri ukončení stavebných prác,
 - údaje o dobe výkonu stavebných prác, jej začiatok a koniec,
 - počet osôb vykonávajúcich práce s uvedením druhu práce, ktorú vykonávajú,
 - zoznam použitých strojov a zariadení,
 - časový postup a spôsob výkonu stavebných prác,
 - výkaz výmer dodávok materiálu v rozsahu v akom v daný deň prichádzajú do úvahy vzhľadom na druh vykonávanej stavebnej činnosti,
 - fotodokumentácia z priebehu stavebných prác zoradená chronologicky na CD,
 - zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
4. Denné záznamy sa píšú do SD – knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Záznamy sa píšú chronologicky za sebou bez vynechania voľného miesta.
5. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne oprávnená osoba písomne poverená zhotoviteľom, stavebný dozor objednávateľa, technický dozor objednávateľa, prípadne oprávnená osoba poverená objednávateľom, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné orgány verejnej moci.

6. Denné záznamy v jednom prepise dostane stavebný dozor objednávateľa osobne naskenovanej podobe na mailovú adresu objednávateľa uvedenú v nasl. ods. 9 tohto Zmluvy, najneskôr do 10.00 hod. dňa nasledujúceho po dni, ktorého sa denný záznam. Objednávateľ je prostredníctvom stavebného dozoru povinný sledovať obsah SD a k zápisom v ňom pripájať svoje stanovisko. Na zápisy v SD musia zmluvné strany reagovať najneskôr 3 pracovných dní po dátume, kedy sa s nimi oboznámili. Ak druhá zmluvná strana na vykonaný zápis v SD v tejto lehote nereaguje, považuje sa vykonaný zápis za druhou stranou odsúhlasený.

Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa:

7. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho:

Meno a Priezvisko: Ing. Jaroslav BALÁK

číslo osvedčenia SKSI na činnosť stavbyvedúceho pre inžinierske stavby: 13702

mobil: +421 905 429 446

mail: jaroslav.balak@eurovia.sk

Tento je oprávnený zastupovať zhotoviteľa pri prevzatí Staveniska, pravidelnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní Diela, a iných úkonoch, na ktoré ho zhotoviteľ musí písomne poveriť.

8. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora osobu Ing. Štefan Sviržovský mobil 0907 818 361, e-mail svams99@gmail.com. V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastupuje: Ing. Adriana Sviržovska, mobil 0905 781 347, e-mail svirzing@gmail.com
9. Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozoru sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť bez zbytočného odkladu.

VI.

Termíny realizácie Diela

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ začne realizovať Dielo bez zbytočného odkladu po prevzatí Staveniska najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia Staveniska.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela (vybraté úseky ciest podľa **Prílohy č. 1** objednávateľovi je najneskôr **do 10 kalendárnych týždňov odo dňa prevzatia staveniska** zhotoviteľom.
3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela v **Harmonograme** postupu prác (vecnom a časovom), ktorý je Prílohou tejto Zmluvy sú pre Zhotoviteľa záväzné.
4. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany vyhotovia písomný Protokol v súlade s článkom IX tejto Zmluvy.
5. Zmluvne dohodnutý termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednávateľovi podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy je možné predĺžiť iba z dôvodov a podmienok podľa článku X, XI tejto Zmluvy, formou písomného Dodatku k Zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

VII.

Cena Diela a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá a stanovená na základe **cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, v zmysle ocenených výkazov výmer, ktoré sú Prílohou č. 1 k Zmluve (ďalej iba „cena Diela“)**. Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov za práce na Diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	128 000,00	Eur
DPH 20 %	25 600,00	Eur
Cena s DPH	153 600,00	Eur

(slovom: **jednostopäťdesiattritisícšesťsto Eur**) s DPH.

2. Predavky objednávateľ neposkytuje.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že cenová ponuka ním predložená vo verejnom obstarávaní a teda cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, že v cene Diela sú zhotoviteľom zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa vynaložené pri vykonávaní Diela odo dňa prevzatia Staveniska až do doby odovzdania Diela ako celku objednávateľovi, vedľajšie náklady – napr. zariadenie staveniska, zriadenie uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, asfaltová zálievka všetkých spojov, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného Diela, fotodokumentácia priebehu realizácie Diela a iné.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.
5. Podkladom pre úhradu ceny Diela bude **jedna faktúra** vystavené zhotoviteľom až po riadnom prevzatí vykonaného Diela objednávateľom. Na účely fakturácie sa za deň prevzatia Diela považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (podľa **Prílohy č. 1** oprávnenou osobou objednávateľa).
6. Zmena fakturácie je prípustná iba v prípade, že práce budú vykonávané počas viacerých daňových období. V takomto prípade bude podkladom pre úhradu ceny diela faktúra (resp faktúry) za príslušné daňové obdobie a konečná faktúra:
 - **faktúra** (resp. faktúry) vystavená zhotoviteľom za časť prác vykonaných a prevzatých objednávateľom na základe jednotlivých preberacích Protokolov v aktuálnom daňovom období v súlade s § 19 ods. 3 písm. a) zákona o DPH a v súlade so zákonom o účtovníctve (tzn. faktúra za všetky odovzdané dokončené časti Diela - samostatne užívania schopné dokončené vybraté úseky ciest v aktuálnom daňovom období),
 - konečná **faktúra** vystavená zhotoviteľom až po riadnom prevzatí vykonaného celého Diela objednávateľom. Na účely fakturácie sa za deň prevzatia Diela považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (poslednej časti vybratého úseku ciest podľa **Prílohy č. 1** oprávnenou osobou objednávateľa)“.
7. Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.
8. Zmluvné strany vzájomne dohodli nasledovné podmienky fakturácie:
 - zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce na jednotlivých vybratých úsekoch ciest podľa **Prílohy č. 1**, pričom skutočne vykonané práce musia byť odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa na jednotlivých súpisoch minimálne v rozsahu „súhlasím, pečiatka objednávateľa a podpis stavebného dozora“
 - faktúra musí byť dokladovaná súpisom vykonaných prác pre každý vybratý úsek cesty podľa **Prílohy č. 1** zvlášť, odsúhlaseným stavebným dozorom objednávateľa a každý súpis vykonaných prác musí byť členený podľa položiek, množstva a zoznamu prác, s uvedením jednotkovej ceny naceneneho Výkazu výmer pre každý vybratý úsek cesty

podľa **Prílohy č. 1** zvlášť,

- faktúra vrátane jednotlivých súpisov vykonaných prác podľa **Prílohy č. 1** musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená na základe jednotkovo naceného Výkazu výmer pre každý vybraný úsek cesty zvlášť tak, aby bolo možné spoľahlivo vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu.
9. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom.
 10. Ak faktúra bude vystavená bez predloženia jednotlivých súpisov vykonaných prác alebo bez odsúhlasenia súpisov objednávateľom alebo v sume nad rámec súpisov vykonaných prác alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkazoch výmer, a to čo i len z nedbanlivosti alebo omylu zhotoviteľa, alebo ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že faktúra nie je spôsobilá na jej úhradu, objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny Diela a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie v lehote do 15 /pätnásť/ pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 30-dňová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej riadnej faktúry.
 11. Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a túto skutočnosť objednávateľovi na jeho žiadať je zhotoviteľ povinný aj preukázať, inak je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do omeškania.
 12. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet zhotoviteľa.
 13. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 14. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odovzdať riadne zhotovené Dielo včas (v lehote podľa ods. 2 článku VI Zmluvy), má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu dohodnutú vo výške 0,1% z ceny Diela bez DPH uvedenej v ods. 1 článku VII Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, splatnú v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktúrou, na účet objednávateľa.
 15. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.
 16. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať Dielo alebo jeho časť.
 17. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so ZVO v platnom znení.
 18. Objávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
 19. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

VIII

Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ predkladá v Prílohe č. 3 k tejto Zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov s uvedením jeho identifikačných údajov, predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej

- konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
 3. Povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku Zmluvy nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
 4. Zmluvné strany sa dohodli za účelom zabezpečenia všetkých povinností zhotoviteľa podľa článku VIII Zmluvy na zmluvnej pokute tak, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny zo strany zhotoviteľa má Objednávateľ okrem práva odstúpiť od Zmluvy aj nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností tohto článku Zmluvy zhotoviteľom, a to aj opakovane.
 5. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovaných povinností zhotoviteľa a cenu Diela.
 6. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinností podľa tohto článku VIII Zmluvy.

IX

Odobovanie a prevzatie Diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa článku III. ods. 1 Zmluvy odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku VI ods. 2 Zmluvy v mieste zhotovovania Diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti Diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia v článku VI ods. 2 Zmluvy, ak to povaha časti Diela pripúšťa a ak je to účelné alebo nevyhnutné z hľadiska obnovenia dopravy na dotknutom úseku cesty.
3. V prípade postupu podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy, ktorý postup sú zmluvné strany povinné dohodnúť v písomnom Protokole pri odovzdaní Staveniska zhotoviteľovi, sa musí vyhotoviť Protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti Diela (verejnej práce) pre každý vybraný úsek zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku IX Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa ods. 2 článku IX Zmluvy s tým, že Dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť (vybraný úsek cesty).
4. Objednávateľ prevezme Dielo za splnenie § 555 ods. 2 Obch. zák. ak Dielo zodpovedá vlastnostiam vymieneným objednávateľom v Zmluve, kvantitatívnym a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na Dielo v Zmluve a tieto vlastnosti a požiadavky sú preukázané

vykonaním dohodnutých skúšok, Dokumentáciou kvality - kvality materiálov a stavieb, pričom ide najmä o nasledovnú dokumentáciu a skúšky:

- vážne lístky asfaltových zmesí, betónov s uvedením výroby, množstva, označenia zmesi, dátumu a názvu stavby, ktoré predkladá zhotoviteľ priebežne počas stavieb a prác,
 - certifikáty, vyhlásenia o zhode vlastností a atesty zabudovaných materiálov, (originálne resp. úradne osvedčená kópia),
 - protokoly o vykonaných skúškach najmä ide o : skúšky asfaltových zmesí odobratých vo výrobe, skúšky asfaltových zmesí odobratých na stavbe (z násypky finišera) podľa TAB 20 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI, ďalej preberacie skúšky hotovej vrstvy v TAB 22 a 23 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI. Pri zjavnom rozpore o dosiahnutej hodnote miery zhutnenia a hrúbky hotovej vrstvy sú rozhodujúce výsledky namerané na vývrtoch. Náklady na vývrty v potrebnom počte (min. 3 vývrty v jednom mieste na ploche 2 000 m² podľa TAB 22 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI) vrátane výplne vzniknutých otvorov hradí zhotoviteľ,
 - Protokoly o vykonaní skúšok-meraní zhutnenia podkladových materiálov v súlade so štandardmi požadovanými v technickej dokumentácii predloženej v rámci súťaže.
 - listy odpadov, doklad o uložení na skládku.
5. Podkladom na prevzatie každej asfaltovej vrstvy vozovky sú výsledky vykonaných skúšok súvisiacich s preukázaním jej kvality. Tieto skúšky pozostávajú z meraní vykonaných na hotovej vrstve a zo skúšok asfaltových vzoriek odobratých z konštrukcie podľa STN EN 12697-27.
6. Výsledky skúšok vykonaných na hotovej úprave budú odsúhlasené stavebným dozorom. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.
7. Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) v čase zhotovovania Diela nesmú byť staršie ako 6 mesiacov, inak sa považujú za neplatné. Skúšobná činnosť musí byť vykonaná akreditovanou skúšobňou.
8. O odovzdaní Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (verejnej práce), ktorú podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň vykonania Diela sa považuje deň uvedený v Protokole ako deň podpisu objednávateľa - osoby oprávnenej za objednávateľa rokovať vo veciach technických.
9. Nevyhnutnou súčasťou Protokolu (vo forme Príloh) sú najmä nasledovné doklady dodané zhotoviteľom:
- dve kópie stavebného denníka,
 - finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania
 - dokumentácia kvality Diela (podľa ods. 4 tohto článku vrátane kvality všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí)
 - doklady o uložení prebytočného materiálu zo staveniska na oficiálnu skládku,
 - fotodokumentácia priebehu zhotovovania Diela.
10. Absencia niektorého z dokladov podľa ods. 9 tohto článku je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
11. Povinnými obsahovými náležitosťami Protokolu je:
- údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi,
 - názov zákazky, číslo Zmluvy,
 - označenie Diela, ktoré sa odovzdáva a preberá (konkrétne vybrané úseky ciest)
 - dátum začatia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum začatia stavebných prác,
 - dátum ukončenia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum ukončenia stavebných prác,
 - skutočný rozsah vykonaných stavebných prác, odsúhlasený stavebným dozorom

- objednávatel'a,
 - označenie stavbyvedúceho, stavebného dozoru, technického dozoru objednávatel'a,
 - cena za príslušnú časť Diela podľa Zmluvy a cena podľa skutočného rozsahu stavebných prác odsúhlasených stavebným dozorom objednávatel'a,
 - prehlásenie objednávatel'a, či príslušnú časť Diela preberá alebo nepreberá
 - prípadne zoznam chýb a nedorobkov a lehoty ich odstránenia
12. Ak Dielo vykazuje drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávatel' má právo rozhodnúť, či Dielo (príslušnú časť Diela) prevezme s drobnými chybami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak Dielo prevezme v Protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb alebo nedorobkov. O tom, či má Dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie Diela, rozhoduje objednávatel'.
 13. Ak objednávatel' odmieta Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody.
 14. Riadnym odovzdaním Diela (príslušnej časti Diela) tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávatel'a na Protokole prechádza na objednávatel'a nebezpečenstvo vzniku škody na Diel. Za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jeho časti zodpovedá zhotovitel' až do času riadneho odovzdania Diela objednávatel'ovi. Zhotovitel' zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotovitel'a počas zhotovovania Diela na majetku objednávatel'a a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na Stavenisku.
 15. Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku objednávatel'. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným časťam Diela použitým zhotovitel'om nadobúda objednávatel' okamihom ich zabudovania do Diela.

X

Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávatel'a alebo zhotovitel'a (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO v platnom znení.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer.
3. Vykonané naviac práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte/VV musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávatel' a zhotovitel' nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neoprávňuje zhotovitel'a spomaliť, alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Zhotovitel' je povinný pri oceňovaní Objednávatel'om uznaných/nariadených naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky a Rozpočtu/VV v jednotlivých Prílohách tejto Zmluvy.
4. Medzi zmluvnými stranami je dohodnutá tzv. „domnienka doručenia“, t. j. každá odoslaná písomnosť sa považuje za doručenie momentom odmietnutia jej prijatia adresátom, alebo uplynutím tretieho dňa od uloženia písomnosti na pošte.
5. Akékoľvek oznámenia či komunikácia podľa tejto zmluvy môžu byť doručené v písomnej forme osobne, kuriérom, doporučenou poštou, emailom s potvrdením prijatia emailu alebo faxom na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo do rúk príslušného zástupcu pre veci technické alebo sms správou doručenou zástupcovi pre veci technické .
6. Kontaktné údaje osôb a okruh osôb oprávnených konať za zmluvnú stranu môžu byť zmenené jednostranným písomným oznámením zmluvnej strany, riadne doručeným príslušnou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súlade s týmto ustanovením zmluvy bez toho, aby zmluvné

strany uzatvorili dodatok k zmluve. Oznámenie bude tvoriť prílohu zmluvy.

7. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.

XI

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou SD upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať následok prerušenie prác.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne Objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby** najmä projektovej dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia
 - prerušiť práce
 - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb**,
 - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb** projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
 - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto odseku článku XI Zmluvy objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela alebo môže spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Harmonograme alebo článku VI Zmluvy.

XII

Zodpovednosť zhotoviteľa, Zmluvné pokuty, Záruka a záručná doba, Banková záruka/Zmluvná zábezpeka

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri zhotovovaní Diela a jeho jednotlivých častí s odbornou starostlivosťou, za striktného dodržiavania všetkých pre realizáciu Diela do úvahy prichádzajúcich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, iných podzákonných predpisov, normatívnych správnych aktov, individuálnych správnych aktov, technických noriem, podmienok dohodnutých v Zmluve a jej Prílohách a požiadaviek objednávateľa.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa podľa článku I, článku III, článku IV ods. 6, ods. 7, ods. 9, článku V ods. 2, ods. 3, článku VI ods. 1, ods. 3, článku XIII ods. 7 Zmluvy alebo ak sa počas realizácie Diela preukáže, že stavebné práce podľa výkazov výmer, čo do kvantitatívnych alebo kvalitatívnych požiadaviek Diela nezodpovedajú množstvu alebo kvalite vymienenej objednávateľom v Zmluve, súťažných podkladoch alebo Dielo nie je zhotovované podľa Harmonogramu prác predloženého zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 0,5% z celkovej ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie povinnosti zvlášť a to aj opakovane. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a/alebo nedorobky, ktoré sú uvedené v odovzdávajúcom protokole alebo v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa riadne a včas odstrániť vady a oznámené - uplatnené objednávateľom v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi

zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny Diela bez DPH za každý začatý deň omeškania za každú takto reklamovanú vadu Diela zvlášť. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odstrániť vady Diela ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak.

4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené v kvalite podľa požiadaviek ods. 1 tohto článku XII Zmluvy a že tieto bude mať i počas plynutia záručnej doby.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo alebo ktorákoľvek jeho časť v čase jeho riadneho odovzdania a prevzatia objednávateľom a za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.
6. Záručná doba je **60 kalendárnych mesiacov** začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela objednávateľom (dňom podpisu oprávneného zástupcu objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí Diela). Záručná doba sa skrúti o dobu, po ktorú objednávateľ neoprávnené odmieta Dielo prevziať. Záruka v rámci plynutia záručnej doby sa vzťahuje na všetky vlastnosti Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová dohodnutá Záručná doba okamihom ich prevzatia objednávateľom.
7. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť v primeranej lehote určenej objednávateľom odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami Zmluvy a relevantnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na Dielo spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu Diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie Diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
9. Dielo má vady, ak Dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám na Dielo alebo jeho časť kladeným .
10. Objednávateľ je oprávnený neprevziať Dielo alebo jeho časť, ktoré nie je vykonané riadne a odovzdané včas podľa podmienok určených v Zmluve. V takom prípade objednávateľ nie je v omeškaní s povinnosťou prevziať Dielo.
11. Uplatnenie väd a nedorobkov v záručnej dobe musí byť podané písomne bez zbytočného odkladu potom, čo vady a nedorobky objednávateľ zistil, najneskôr v lehote 3 dní odo dňa zistenia väd a nedorobkov.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty v ods. 3 tohto článku Zmluvy za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.
13. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:
 - a/ ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
 - b/ ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.
14. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu Diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
15. Uplatnením nárokov z väd Diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

16. V prípade, že objednávateľovi bude spôsobená alebo vznikne škoda v dôsledku neposkytnutia zhotoviteľom, alebo bude objednávateľovi uložená akákoľvek sankcia za porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov zhotoviteľom alebo z titulu povinnosti zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný takto vzniknutú škodu, sankciu uhradit objednávateľovi v plnom rozsahu.
17. Zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorého je záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela a garančné vady podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5% z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „banková záruka“). Banková záruka je vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a je vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v platnom znení, obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 5 % z ceny Diela bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa zmluvy o dielo. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 5% z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
- rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
 - zriadenie novej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

Alternatíva.:

Zhotoviteľ predložil najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zmluvná zábezpeka najmä na vady diela a garančné vady. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že zmluvná zábezpeka slúži uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela a garančné vady podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5 % z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „zmluvná zábezpeka“). Objednávateľ si v lehote 15 dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu zo zmluvnej zábezpeky až do výšky 5 % z ceny Diela bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený použiť zmluvnú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia zmluvnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť zmluvnú

zábezpeku do plnej výšky, t.j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zloženie finančných prostriedkov na účet objednávateľa tak, aby celková suma takto doplnenej zmluvnej zábezpeky dosiahla minimálne 5 % z ceny Diela bez DPH. Objednávateľ je povinný zmluvnú zábezpeku vo výške k času uplynutia záručnej doby na Dielo v lehote najneskôr do 15 dní od uplynutia záručnej doby na Dielo vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Pozn. č. 1: použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží bankovú záruku alebo zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa (zhotoviteľa).

Čl. XIII

Zánik zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, z dôvodov podľa ustanovení ZVO (§ 19) alebo z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Po uvedení doby je pre plnenie tejto Zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky zhotoviteľa.
3. Zmluva zaniká:
 - a) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
 - b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a zhotoviteľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní,
 - c) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie Zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie Dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - dohoda o podstatných náležitostiach súvisiacich s ukončením Zmluvy najmä vypořádanie záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia Zmluvy.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovedty uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká okrem práv a povinností podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy, a to v momente keď prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
6. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú najmä omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve a na náhradu nákladov, oprávnených výdavkov a strát vzniknutých z dôvodov odstúpenia od Zmluvy.
7. Po uzavretí Zmluvy je objednávateľ, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné, oprávnený od Zmluvy odstúpiť titulom jej **podstatného porušenia** najmä v prípade, ak:
 - a) zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,

- b) zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 1 tejto zmluvy
 - c) zhotoviteľ včas nespĺní akúkoľvek povinnosť určenú súťažnými podmienkami alebo požiadavkami bez preukázania splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať prácu, pričom objednávatel' má v prípade porušenia povinností podľa písm. c/ tohto ods. 2 zmluvnú pokutu vo výške podľa článku XII ods. 2 Zmluvy
 - d) zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie Diela uvedeného v Harmonograme postupu prác o viac ako 7 kalendárnych dní,
 - e) zhotoviteľ je z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenej objednávateľom (napr. v stavebnom denníku),
 - f) zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním Diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
 - g) zhotoviteľ preukázateľne nevykonáva Dielo s odbornou starostlivosťou, alebo s podmienkami Zmluvy alebo vykonáva Dielo v rozpore s pokynom objednávateľa a napriek písomnej výzve objednávateľa nedôjde k náprave v určenej lehote,
 - h) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
 - i) zhotoviteľ opakovane nespĺní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nespĺnením/porušením sa rozumie nespĺnenie/porušenie minimálne dvakrát)
 - j) voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; zhotoviteľ je povinný ihneď informovať objednávateľa o skutočnostiach podľa písm. j/ ods. 6 tohto článku, inak má objednávatel' právo na zmluvnú pokutu vo výške podľa článku XII ods. 2 Zmluvy alebo
 - k) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve je nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela, pričom objednávatel' má právo v prípade preukázania skutočností podľa tohto písm. k/ na zmluvnú pokutu vo výške podľa článku XII ods. 2 Zmluvy
 - l) objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná.
8. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak objednávatel' podstatným spôsobom poruší Zmluvu. Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny Diela o viac ako 30 dní, pričom Dielo objednávatel' prevzal podľa podmienok v tejto Zmluve, alebo neposkytnutie súčinnosti objednávateľa podľa podmienok v Zmluve.
9. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene Diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd Diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo Zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy pre porušenie povinností Zhotoviteľom, má Objednávatel' nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa, ktorý Dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete Zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na Objednávateľa vlastnicke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

1. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
2. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluvu je možné zrušiť písomnou Dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania Diela budú dostupné pre objednávateľa na jeho požiadanie všetky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie Diela.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
5. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
10. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
12. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným, neúčinným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, nemá a ani v budúcnosti to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto Dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného

ustanovenia iné ustanovenia Zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, použijú sa uslovné ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právom a v súlade s ním, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.


13. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.

14. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

- Príloha č. 1: Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa
- Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram postupu prác
- Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 4: Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka
- Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/zložení zábezpeky na účet

V Novej Bani dňa: 8.8.2019

Za objednávateľa:


Technické služby
mesta Novej Bani
Dlhá 1060, 068 01 Nová Baňa
IČO: 00185221, IČ DPH: SK2021111345


František Bakoš
(štatutárny zástupca objednávateľa)

V Košiciach


dňa: 5.8.2019

Za zhotoviteľa:




Ing. Robert Šinály
podpredsa predstavenstva
a generálny riaditeľ

20


Ing. Juraj Dančíš
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ
investičný riaditeľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 35
Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Nad Hradzou, Nová Baňa

JKSO:
Miesto: Nová Baňa

Objednávateľ:
Technické služby mesta Nová Baňa

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK a.s

Projektant:
PROJEKT ateliér NB

Spracovateľ:
G.Kolcúnova

Poznámka:

KS:
Dátum: 1. 7. 2019

IČO: 20211113454
IČ DPH: SK20211113454

IČO: 31651518
IČ DPH: 2020490274

IČO: 455336813
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			128 000,00
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	128 000,00	25 600,00
Cena s DPH			153 600,00

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Technické služby
mesta Nová Baňa
Dlhá ulica 18, 968 01 Nová Baňa
IČO: 00185221 IČ DPH: SK2021111345

Dátum a podpis:

Pečiatka


EUROVIA
VINCI
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 35

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Nad Hradzou, Nová Baňa

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 1. 7. 2019

Objednávateľ: Technické služby mesta Nová Baňa

Projektant: PROJEKT atelier NB

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s

Spracovateľ: G.Kolcúnova

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
	Náklady z rozpočtov	128 000,00	153 600,00
01-upr	ul. Nad Hrádzou - Nová Baňa - cena do ZoD	128 000,00	153 600,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Nad Hradzou, Nová Baňa

Objekt: ul. Nad Hradzou - Nová Baňa - cena do ZoD

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 1. 7. 2019

Objednávateľ: Technické služby mesta Nová Baňa

Projektant: PROJEKT atelier NB

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s

Spracovateľ: G.Kolcúnova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

128 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 128 000,00

D 1 Zemné práce 14 694,81

17	K	113152110	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	198,000	6,00	1 188,00
16	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 70 mm 0,127 t - zápichy	m2	200,000	6,00	1 200,00
8	K	120001101	Výkop sond	m3	10,000	46,40	464,00
1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	698,890	2,97	2 075,70
11	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	698,890	2,69	1 880,01
12	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 397,780	0,28	391,38
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	698,890	0,75	524,17
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	698,890	4,64	3 242,85
9	K	181101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 248,000	1,65	2 059,20
15	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov - úprava terénu	m2	1 575,000	1,06	1 669,50

D 2 Zakladanie 0,00

22	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5N	m2	0,000	0,00	0,00
23	M	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, N	m2	0,000	0,00	0,00
21	K	212572121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého N	m3	0,000	0,00	0,00
20	K	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm N	m	0,000	0,00	0,00

D 5 Komunikácie 106 623,90

2	K	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr.500 mm	m2	1 248,000	12,37	15 437,76
4	K	565141211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 248,000	10,48	13 079,04
24	K	567133113	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm N	m2	0,000	0,00	0,00
6	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	6 851,500	0,44	3 014,66
7	K	577154281	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	6 851,500	10,96	75 092,44

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 681,29

5	K	919716200	Vystuženie asfaltových vozoviek (krytov) mrežov pre vozovky	m2	1 818,000	3,09	5 617,62
10	K	938908401	Očistenie povrchu vozovky zametáním	m2	1,170	0,05	0,06
18	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	308,348	2,89	891,13
19	K	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	616,000	0,28	172,48

Harmonogram stavby "Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Nad Hradzou, Nová Baňa"

Kód položky	Popis	M.J.	Množstvo	2019																	
				1 týždeň							2 týždeň										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
35	Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Nad Hradzou, Nová Baňa																				
01	ul. Nad Hradzou - Nová Baňa																				
	Zemné práce		198,000																		
1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m ²	200,000																		
113152110	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 70 mm 0,127 t - záplchy	m ³	10,000																		
113152130	Výkop sond	m ³	698,890																		
120001101	Výkop sond	m ³	698,890																		
122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	698,890																		
162501102	Vodovorné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok vzdialenosť do 3000 m	m ³	1 397,780																		
162501105	Vodovorné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatkoch 1000 m	m ³	698,890																		
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	698,890																		
171209002	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	698,890																		
171209002	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	698,890																		
181101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	1 248,000																		
181101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	1 248,000																		
182201101	Svahovanie trvalých svahov - úprava terénu	m ²	1 575,000																		
2	Zakladanie		0,000																		
211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v rýhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5N	m ³	0,000																		
212572121	Lôžko pre tratívod z kamienka drobného ťaženého N	m	0,000																		
212755116	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm N	m	0,000																		
5	Komunikácie		1 248,000																		
564861111	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr.500 mm	m ²	1 248,000																		
564861111	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr.500 mm	m ²	1 248,000																		
565141211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	0,000																		
565141211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	0,000																		
567133113	Podklad z kamienka stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm N	m ²	6 851,500																		
567133113	Podklad z kamienka stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm N	m ²	6 851,500																		
573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	6 851,500																		
573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	6 851,500																		
577154281	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	1 818,000																		
577154281	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	1 818,000																		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1,170																		
919716200	Vysluženie asfaltových vozoviek (krytov) mrežov pre vozovky	m ²	1,170																		
919716200	Vysluženie asfaltových vozoviek (krytov) mrežov pre vozovky	m ²	1,170																		
938908401	Očistenie povrchu vozovky zametáním	t	308,348																		
938908401	Očistenie povrchu vozovky zametáním	t	308,348																		
979083114	Vodovorné premiestnenie sutiňy na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	616,000																		
979083114	Vodovorné premiestnenie sutiňy na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	616,000																		
979083191	Príplatok za každých ďalších i začiatkoch 1000 m po spevnenej ceste pre vodovorné premiestnenie sutiňy	t	616,000																		
979083191	Príplatok za každých ďalších i začiatkoch 1000 m po spevnenej ceste pre vodovorné premiestnenie sutiňy	t	616,000																		

PRÍLOHA Č. 3 - ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH


Na realizácii zmluvy uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa budú podieľať subdodávateľia: **ÁNO/NIE**


Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Predmet subdodávok	Podiel predpokladaných subdodávok v %
1.			
2.			
3. atď.			
SPOLU			

V Košiciach dňa



Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa:
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
Košice 040 17


Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.


Ing. Juraj Dančíš – člen predstavenstva a.s.



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Jaroslav Baľák

06.06.1991
narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti


stavbyvedúci

s evidenčným číslom **13702**

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

12.12.2018
Dátum vydania





prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Predseda SKSI

Identifikačné údaje výroby asfaltových zmesí/obaľovacej súpravy

Uchádzač : EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

pre naplnenie predmetu zákazky „Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Nad Hrádzou, Nová Baňa“ predpokladá využiť nasledovnú výrobu asfaltových zmesí:

Obchodné meno: OC Beladice
Sídlo: Beladice 951 75
IČO: 44 557 051



.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda
predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ
investičný riaditeľ



Notifikovaná osoba č. 1301

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

Certifikát zhody systému riadenia výroby

1301 – CPR – 0091

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011 (Nariadenie o stavebných výrobkoch - CPR) sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Kamenivo

charakterizované ako:

- kamenivo do betónu podľa EN 12620
- kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch podľa EN 13043
- kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242
- kamenivo do malty podľa EN 13139
- kamenivo na koľajové lôžko podľa EN 13450
- kameň na vodné stavby podľa EN 13383-1

so zamýšľaným použitím uvedeným na rube tohto certifikátu.

Uvedený na trh pod menom

Kameňolom Sokolec, s. r. o., 966 01 Bzenica
Slovenská republika

a vyrábaný vo výrobní

Kameňolom Sokolec, s. r. o., 966 01 Bzenica

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti parametrov uvedených v prílohe ZA normy

EN 12620: 2002+A1: 2008, EN 13043: 2002, EN 13043: 2002/AC: 2004,
EN 13242: 2002+A1: 2007, EN 13139: 2002, EN 13139: 2002/AC: 2004, EN 13450: 2002,
EN 13450: 2002/AC: 2004, EN 13383-1: 2002, EN 13383-1: 2002/AC: 2004

podľa systému 2+ sú uplatnené a

systém riadenia výroby je posúdený ako zhodný s uplatniteľnými požiadavkami.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 23. marca 2005 (podľa CPD) a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa harmonizované normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania a overovania nemennosti parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený notifikovanou osobou na certifikáciu riadenia výroby.

Bratislava 29. júla 2016




Ing. Daša Kozáková
vedúca Notifikovanej osoby 1301

078839

Notifikovaná osoba č. 1301



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

Príloha 1 certifikátu zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 0091


Výrobca: Kameňolom Sokolec, s. r. o., 966 01 Bzenica

Výrobňa: Kameňolom Sokolec, s. r. o., 966 01 Bzenica

Poradové číslo	Stavebný výrobok	Technická špecifikácia
1	Prírodné kamenivo drobné 0/2	EN 12620
2	Prírodné kamenivo drobné 0/4	EN 12620
3	Prírodné kamenivo hrubé 4/8	EN 12620
4	Prírodné kamenivo hrubé 8/16	EN 12620
5	Prírodné kamenivo hrubé 8/22	EN 12620
6	Prírodné kamenivo hrubé 16/22	EN 12620
7	Prírodné kamenivo drobné 0/2	EN 13043
8	Prírodné kamenivo štrkodrvina 0/4	EN 13043
9	Prírodné kamenivo hrubé 2/4	EN 13043
10	Prírodné kamenivo hrubé 4/8	EN 13043
11	Prírodné kamenivo hrubé 4/11	EN 13043
12	Prírodné kamenivo hrubé 8/11	EN 13043
13	Prírodné kamenivo hrubé 8/16	EN 13043
14	Prírodné kamenivo hrubé 11/16	EN 13043
15	Prírodné kamenivo hrubé 11/22	EN 13043
16	Prírodné kamenivo hrubé 16/22	EN 13043
17	Prírodné kamenivo drobné 0/2	EN 13139
18	Prírodné kamenivo hrubé 2/4	EN 13139
19	Prírodné kamenivo hrubé 4/8	EN 13139
20	Prírodné kamenivo drobné 0/4	EN 13242
21	Prírodné kamenivo štrkodrvina 0/8	EN 13242
22	Prírodné kamenivo štrkodrvina 0/16	EN 13242
23	Prírodné kamenivo štrkodrvina 0/22	EN 13242
24	Prírodné kamenivo štrkodrvina 0/32	EN 13242
25	Prírodné kamenivo štrkodrvina 0/45	EN 13242
26	Prírodné kamenivo štrkodrvina 0/63	EN 13242
27	Prírodné kamenivo hrubé 4/8	EN 13242
28	Prírodné kamenivo hrubé 8/16	EN 13242
29	Prírodné kamenivo hrubé 16/22	EN 13242
30	Prírodné kamenivo hrubé 16/32	EN 13242
31	Prírodné kamenivo hrubé 32/63	EN 13242
32	Prírodné kamenivo štrkodrvina 0/90	EN 13242
33	Prírodné kamenivo hrubé 32/50	EN 13450
34	Prírodné kamenivo hrubé 32/63	EN 13450
35	Prírodný kameň na vodné stavby - LMA _{40/200}	EN 13383-1

Bratislava 29. júla 2016




Ing. Daša Kozáková
vedúca Notifikovanej osoby 1301

VOHLÁSENI O PARAMETROCH

Výrobok: Prírodné kamenivo štrkodrvina, fr. 0/63

Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest

Zamýšľané použitie výrobku: Na výrobu hydraulicky stmelených a nestmelených zmesí používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest

Obchodné meno a adresa výrobcu, IČO:
Kameňolom Sokolec, s.r.o., 966 01 Bzenica, IČO 36023574

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: 2+

Názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby:
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 21 04
Bratislava
Notifikovaná osoba 1301

Certifikát zhody systému riadenia výroby: 1301 – CPR – 0091

Deklarované parametre

Podstatná vlastnosť	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia – EN 13242
Petrografické zloženie – druh kameniva	Andezit $\geq 99\%$	čl. 9.1
Frakcia, trieda zrnitosti	0/63: $G_A 80$	čl. 4.2, 4.3
Medzné odchýlky typickej triedy zrnitosti	$G_A 10$	čl. 4.3.3
Obsah jemných zrn	NPD	čl. 4.6
Kvalita jemných zrn	NPD	čl. 4.7, príloha A
Objemová hmotnosť	$\leq 2,40 \text{ Mg.m}^{-3}$	čl. 5.4
Nasiakavosť	$\leq 2,5\%$	čl. 5.5
Síraný rozpustný v kyseline	$AS_{0,2}$	čl. 6.2
Celkový obsah síry	S_1	čl. 6.3
Zložky meniace rýchlosť tuhnutia a tvrdnutia hydraulicky stmelených zmesí – obsah humusu	neobsahuje	čl. 6.5.1
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	F_1	čl. 7.3.3

Parametre výrobku: Prírodné kamenivo štrkodrvina, fr. 0/63, sú v zhode s parametrami deklarovanými v tabuľke.

Toto vyhlásenie o parametroch vydáva výrobca na svoju výhradnú zodpovednosť.

Miesto a dátum vydania: Bzenica 29.07.2019

V mene výrobcu podpísal: Ing. Hlinka Marian, riaditeľ spoločnosti

Kameňolom
SOKOLEC s.r.o.
966 01 Bzenica

v z. *Cyril*

Vyhlásenie o parametroch sa vystavuje pre spol.:	EUROVIA SK, a.s. závod Stred Medený Hámor 4 974 01 Banská Bystrica		
množstvo	932,77 ton	Č. vyhlásenia:	13242_063_07/2019

Certifikát zhody systému riadenia výroby

1480-CPR-0054

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Nariadenie o stavebných výrobkoch - CPR), sa tento certifikát vzťahuje na stavebné výrobky

Katiónaktívne asfaltové emulzie

používané na spojovacie postreky, stavbu kalových zákrytov a náterov vozoviek cestných komunikácií, dopravných a iných plôch, ktorých zoznam je v prílohe, vyrábané výrobcom

BITUNOVA spol. s r.o.

Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

vo výrobní

Emulgačná stanica BITUNOVA spol. s r. o. Zvolen

Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti parametrov uvedených v norme

EN 13808:2013

podľa systému 2+ sú uplatnené

systém riadenia výroby spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 17.03.2010 a ostáva v platnosti, pokiaľ sa nezmenia metódy skúšania a/alebo požiadavky systému riadenia výroby obsiahnuté v harmonizovanej norme použité na posudzovanie parametrov deklarovaných vlastností, významne sa nezmení výrobok a podmienky výroby vo výrobní.



Ri

Bratislava, 8. augusta 2014

Ing. Vladimír Řikovský, CSc.
vedúci notifikovanej osoby

028277

BITUNOVA**Vyhlásenie o parametroch
č. 1**

Výrobok:

C50B4 / BIT-50K

Je katiónaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná, používaná na zhotovenie spojovacích a infiltračných postrekov pri stavbe, opravách a údržbe vozoviek komunikácií s triedou dopravného zaťaženia I. až VI. v zmysle STN 73 6114. Výrobok sa nesmie používať v uzatvorených priestoroch a neskôr ako 56 dní od dodania.

Výrobca:

BITUNOVA spol. s r.o.

Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

Výrobňa:

Emulgačná stanica BITUNOVA spol. s r.o., Zvolen

Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

Harmonizovaná špecifikácia:

EN 13808:2005

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku a číslo certifikátu:

Systém 2+, 1480-CPD-0054

Certifikát vydala notifikovaná osoba NO 1480:

VUIS-CESTY spol. s r.o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

Deklarované parametre:


Č.	Vlastnosť	Jednotka	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie	Protokol o skúške
A	Vlastností emulzie				
1	Zjavné vlastnosti	žiadna	tmavohnedá Tr. 1	STN EN 1425	70-09-0063 ¹⁾
2	Polarita častíc	žiadna	kladná Tr. 2	STN EN 1430	70-09-0063 ¹⁾
3	Hodnota štiepilevnosti	žiadna	70-130 Tr. 4	STN EN 13075-1	07/2010 ²⁾
4	Obsah spojiva /podľa obsahu vody/	% (m/m)	48-52 Tr. 3	STN EN 1428	07/2010 ²⁾
5	Doba výtoku pri 40°C, otvorom 2 mm	s	15-45 Tr. 3	STN EN 12846	07/2010 ²⁾
6	Zostatok na sieti, sito 0,5 mm	% (m/m)	≤ 0,5 Tr. 4	STN EN 1429	07/2010 ²⁾
7	Zostatok na sieti, 17 dní skladovanie/ sito 0,5 mm	% (m/m)	≤ 0,5 Tr. 4	STN EN 1429	07/2010 ²⁾
8	Prínavosť	% obalenia	≥ 75 Tr. 2	STN EN 13614	07/2010 ²⁾
9	Stanovenie pH	pH	2,29 Tr. 2	STN EN 12850	07/2010 ²⁾
B	Vlastností po spätnom získaní (Znovu získanie spojiva odparením EN 13074)				
10	Penetrácia pri 25°C	0,1 mm	≤ 150 Tr. 4	STN EN 1426	70-09-0378 ¹⁾
11	Bod mäknutia	°C	≥ 39 Tr. 5	STN EN 1427	70-09-0378 ¹⁾
C	Vlastností po spätnom získaní a po stabilizácii (Stabilizácia spojiva EN 14895)				
12	Penetrácia pri 25°C	0,1 mm	99 Tr. 2	STN EN 1426	70-09-0378 ¹⁾
13	Bod mäknutia	°C	45,8 Tr. 2	STN EN 1427	70-09-0378 ¹⁾
D	Vlastností po spätnom získaní, po stabilizácii a starnutí (Stabilizácia spojiva EN 14895, Urýchlené dlhodobé starnutie EN 14769)				
14	Penetrácia pri 25°C	0,1 mm	31 Tr. 2	STN EN 1426	70-09-0378 ¹⁾
15	Bod mäknutia	°C	56,0 Tr. 2	STN EN 1427	70-09-0378 ¹⁾

Názvy a adresa laboratórií, ktoré vykonali skúšky výrobku:


- 1) Laboratórium: TSÚS, n.o., pobočka Košice, Krmanova 5, 040 01 Košice
- 2) Laboratórium: Emulgačná stanica BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Dátum: 01.07.2013

Zástupcovia výrobcu:


Ing. Miroslav Šufjarsky
konateľ spoločnosti
BITUNOVA spol. s r.o.

BITUNOVA
BITUNOVA spol. s r.o.
NERESNICKA CESTA 3
SK - 960 01 ZVOLEN


Ing. Mária Melichová
konateľ spoločnosti
BITUNOVA spol. s r.o.

Certifikát zhody systému riadenia výroby

1480-CPR-0057

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, (nariadenie o stavebných výrobkoch – CPR), sa tento certifikát vzťahuje na stavebné výrobky

ASFALTOVÉ ZMESI

používané na stavbu vrstiev vozoviek cestných komunikácií, dopravných a iných plôch, ktorých zoznam je v prílohe, vyrábané výrobcom

EUROVIA SK a.s.

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, Slovenská republika

vo výrobni

Obal'ovacie centrum Beladice

951 75 Beladice, Slovenská republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti parametrov uvedených v prílohách ZA noriem

EN 13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008


EN 13108-5:2006, EN 13108-5:2006/AC:2008

podľa systému 2+ sú uplatnené a

systém riadenia výroby je posúdený ako zhodný s uplatniteľnými požiadavkami.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 03.09.2010 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa harmonizované normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania a overovania nemennosti parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobni významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený notifikovanou osobou na certifikáciu riadenia výroby.

Bratislava, 29. júna 2018



Ing. Róbert Kovács
vedúci notifikovanej osoby

Pokračovanie tabuľky

30	AC 22 podklad PMB 25/55-65, I, 1105/2017	EN 13108-1
31	AC 22 podklad PMB 10/40-65, I, VMT, 1104/2017	EN 13108-1
32	AC 8 obrus 50/70, II, 1212/2017	EN 13108-1
33	AC 16 obrus 50/70, II, 1439/2017	EN 13108-1
34	AC 11 obrus PMB 45/80-75, 551/2014; MI	EN 13108-1
35	SMA 11 PMB 45/80-75, 74/2014; MK	EN 13108-5
36	AC 11 obrus PMB 45/80-75, 551/2014; MK	EN 13108-1



V Bratislave, dňa 29. júna 2018

R. Kovács
Ing. Róbert Kovács
vedúci notifikovanej osoby 1480



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 11/KA50

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:

Asfaltový betón.

AC 22 podklad 50/70, II, 141/2015

2. Zamýšľané použitie:

Pre vozovky IV., V. a VI. triedy dopravného zaťaženia určené do podkladovej vrstvy vozovky.

3. Výrobca:

EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, Slovenská republika, IČO: 31651518
Obal'ovacie centrum Beladice, 951 75 Beladice

4. Splnomocnený zástupca:

Ing. Marcel Baláž, riaditeľ Závodu Obal'ovne, EUROVIA SK, a.s., Závod Obal'ovne, Partizánska 681/26,
058 01 Poprad, Slovenská republika

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

2+

6a. Harmonizovaná norma:

EN 13108 – 1:2006/AC:2008

Notifikovaný subjekt:

Notifikovaná osoba č. 1480 – VUIS – CESTY, spol. s r.o. vykonala počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly v systéme 2+ a vydala:

Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1480 – CPR – 0057

6b. Európsky hodnotiaci dokument: nie je relevantné



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 18/KA50

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:

Asfaltový betón.

AC 11 obrus 50/70, II, 122/2015

2. Zamýšľané použitie:

Pre vozovky IV., V. a VI. triedy dopravného zaťaženia určené do obrusnej vrstvy vozovky.

3. Výrobca:

EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, Slovenská republika, IČO: 31651518
Obal'ovacie centrum Beladice, 951 75 Beladice

4. Splnomocnený zástupca:

Ing. Marcel Baláž, riaditeľ Závodu Obal'ovne, EUROVIA SK, a.s., Závod Obal'ovne, Partizánska 681/26,
058 01 Poprad, Slovenská republika

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

2+

6a. Harmonizovaná norma:

EN 13108 – 1:2006/AC:2008

Notifikovaný subjekt:

Notifikovaná osoba č. 1480 – VUIS – CESTY, spol. s r.o. vykonala počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly v systéme 2+ a vydala:

Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1480 – CPR – 0057

6b. Európsky hodnotiaci dokument: nie je relevantné

Rozbor asfaltovej zmesi spracúvanej za horúca

Postup skúšania podľa požiadaviek STN EN uvedených v tabuľke a STN EN 933-1

Objednávateľ: EUROVIA SK, a.s., závod Obalovne
Partizánska 681/26, 058 01 Poprad

Obal'ovacia súprava:

Dátum odberu:

Meno skúšajúceho :

Dátum skúšky :

OC Beladice **Číslo ST :**

3.6.2019

Číslo zápisu o odbere:

Kolesár

3.6.2019

Typ zmesi :

141/2015

56/Az/Be/19


AC 22 podklad 50/70;II

Protokol je bez preberacích skúšok na stavbu a slúži výhradne na vnútropodnikovú kontrolu výroby podľa STN EN 13108-21.

Fyzikálno- mechanické vlastnosti zmesi		Postup skúšania podľa STN EN	Požiadavka podľa skúšky typu	Výsledok skúšky
Obsah spojiva S (%)		STN EN 12697-1	B min. 3,7 / max. 4,6	3,8
Maximálna objemová hmotnosť ρ_{mv} (Mg/m ³)		STN EN 12697-5	-	-
Objemová hmotnosť ρ_{bssd} (Mg/m ³)		STN EN 12697-6	-	-
Medzerovitost V_m (%)				-
Medzerovitost kameniva VMA (%)		STN EN 12697-8	-	-
Percento medzier vyplnených asfaltom VFB (%)				-
Percentuálny podiel jemných zrn f (%)		STN EN 12697-2	f	5,5

Sito	Ostatok	Prepad			
		KS		ST	
mm	g	%			
32	0,0	0,0	100,0	100	100
22	0,0	0,0	100,0	90	100
16	142,3	12,8	87,2	76	90
11	278,3	25,1	62,0	60	77
8	117,8	10,6	51,4	48	66
4	158,9	14,3	37,0	32	50
2	138,4	12,5	24,5	18	32
1	84,1	7,6	16,9	13	27
0,5	50,7	4,6	12,4	10	20
0,25	35,9	3,2	9,1	8	18
0,125	24,9	2,2	6,9	5	15
0,063	14,9	1,3	5,5	4	10
dno	61,2	5,5			

Zrnitost' zmesi (STN EN 12697-2, STN EN 933-1):

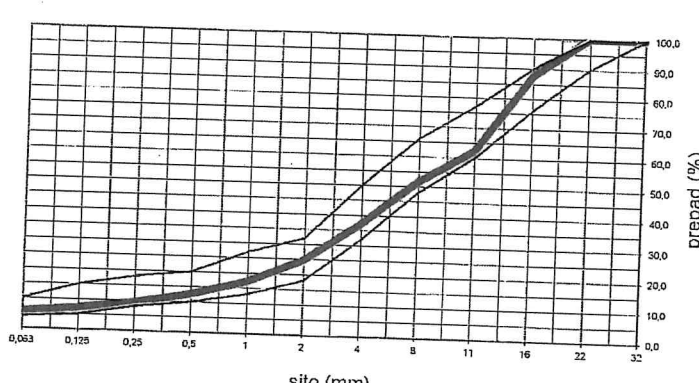

KS- kontrolná skúška ST - skúška typu

Vyhodnotenie : Výsledky skúšok vyhovujú uvedeným požiadavkám.

Výsledky skúšok sa týkajú iba uvedeného predmetu skúšky, nenahrádza iné dokumenty. Protokol o skúške môže byť reprodukován iba celý, v prípade jeho reprodukcie po častiach iba s písomným súhlasom vedúceho laboratória.



Schválil : vedúci laboratória Ing. Piroško-Kiráľ

Dňa :

3.6.2019

Rozbor asphaltovej zmesi spracúvanej za horúca

Postup skúšania podľa požiadaviek STN EN uvedených v tabuľke a STN EN 933-1

Objednávateľ: EUROVIA SK, a.s., závod Obaľovne
Partizánska 681/26, 058 01 Poprad


Obal'ovacia súprava: OC Beladice **Číslo ST :** 122/2015
Dátum odberu: 3.7.2019 **Číslo zápisu o odbere:** 84/Az/Be/19
Meno skúšajúceho: Kolesár **Typ zmesi :** AC 11 obrus 50/70;II
Dátum skúšky: 3.7.2019

Protokol je bez preberacích skúšok na stavbu a slúži výhradne na vnútropodnikovú kontrolu výroby podľa STN EN 13108-21.

Fyzikálno- mechanické vlastnosti zmesi	Postup skúšania podľa STN EN	Požiadavka podľa skúšky typu	Výsledok skúšky
Obsah spojiva S (%)	STN EN 12697-1	B min. 5,1 / max. 6,0	5,3
Maximálna objemová hmotnosť ρ_{mv} (Mg/m ³)	STN EN 12697-5	-	2,469
Objemová hmotnosť ρ_{bssd} (Mg/m ³)	STN EN 12697-6	-	2,406
Medzerovitost V_m (%)	STN EN 12697-8	V min. 2,5 / max. 4,5	2,6
Medzerovitost kameniva VMA (%)		-	15,0
Percento medzier vyplnených asfaltom VFB (%)	STN EN 12697-2	VFB min. 75/max. 86	82,9
Percentuálny podiel jemných zrn f (%)		f	8,8

Sito	Ostatok	Prepad			
		KS		ST	
mm	g	%			
32	0,0	0,0	100,0	100	100
22	0,0	0,0	100,0	100	100
16	0,0	0,0	100,0	98	100
11	80,3	8,3	91,7	90	100
8	144,7	15,0	76,6	70	84
4	286,2	29,8	46,8	45	59
2	147,3	15,3	31,5	28	40
1	86,4	9,0	22,6	17	29
0,5	53,1	5,5	17,0	12	20
0,25	37,0	3,8	13,2	9	17
0,125	25,2	2,6	10,6	7	15
0,063	17,3	1,8	8,8	7	11
dno	84,3	8,8			

Zrnitost zmesi (STN EN 12697-2, STN EN 933-1):

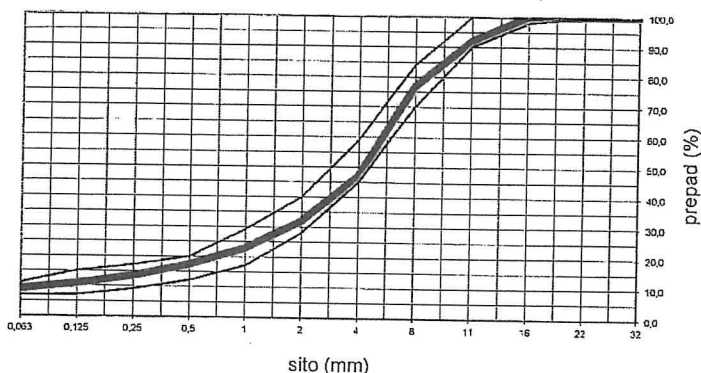


KS- kontrolná skúška ST - skúška typu

Vyhodnotenie : Výsledky skúšok vyhovujú uvedeným požiadavkám.

Výsledky skúšok sa týkajú iba uvedeného predmetu skúšky, nenahrádza iné dokumenty. Protokol o skúške môže byť reprodukováný iba celým, v prípade jeho reprodukcie po častiach iba s písomným súhlasom vedúceho laboratória.



Schválil : vedúci laboratória Ing. Piroško-Kiráň  **Dňa :**

3.7.2019

Penetrácia a bod mäknutia asfaltu

Spôsob skúšania podľa požiadaviek STN EN 1426, STN EN 1427

Objednávateľ: EUROVIA SK, a.s., závod Obaľovne, OC Beladice
Partizánska 681/26, 058 01 Poprad

Druh asfaltu: 50/70
Dátum odberu: 9.7.2019
Dátum dodania do laboratória: 11.7.2019
Dátum skúšky: 11.7.2019
Číslo záznamu o odbere: 11/A/Be/19

Výrobca: Total ČR s.r.o
Miesto odberu: OC Beladice
Vzorka č.: 604
Meno skúšajúceho : Šoltésová

Názov skúšky	Kritéria podľa STN EN 12 591	Osvedčenie o akosti č.	Namerané hodnoty
Penetrácia pri 25 °C STN EN 1426	50 až 70		63,5 (x0,1 mm)
Bod mäknutia KG STN EN 1427	46 až 54		47,5 (°C)

Poznámka:

Použitie prístrojové vybavenie:

Penetrometer typ: OFD	098-KE
Laboratórna sušiareň typ: Memmert	115-KE
Vodný kúpeľ typ: 1002	120-KE
Prístroj KG	097-KE
Digitálny teplomer	070-KE
Penetračné ihly	079-KE, 080-KE
Chladnička	101-KE

Vyhodnotenie: Výsledok skúšky vyhovuje uvedeným požiadavkám.

Výsledky skúšok sa týkajú iba uvedeného predmetu skúšky, nenahrádza iné dokumenty. Protokol o skúške môže byť reprodukován iba celým, v prípade reprodukcie po častiach iba s písomným súhlasom vedúceho laboratória.

Schválil : vedúci laboratória Ing. Piroško-Kiráľ

Dňa : 11.7.2019



Stanovenie zrnitosti (sitový rozbor)

Postup skúšania : podľa požiadaviek STN EN 933-1

Objednávateľ: UNIASFALT, s.r.o.
Selpice 136, 919 09, Selpice

Lom: Žirany **Vzorka č.:** 160
Druh: Vápenec jemne mletý **Číslo zápisu o odbere:** 102/KM/Vi/19
Miesto odberu: zásobník OC **Dátum odberu:** 21.6.2019
Meno skúšajúceho : Ing. Knisa **Dátum dodania do laboratória :** 21.6.2019
Dátum skúšky : 21.6.2019

Skúška zrnitosti

Označenie sít (mm)	Ostatok (g)		Priemerný ostatok (g)	Priemerný ostatok (%)	Celkový prepad(%)	Percentuálny hmotnostný podiel prepadu	
	I	II				Požiadavka KLK 1/2009	Kategória
4					100,0		
2					100,0		
1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
0,25	2,2	2,7	2,5	0,8	99,2		
0,125	19,4	21,7	20,6	6,9	92,3		
0,063	41,7	43,3	42,5	14,2	78,2	0,063	prepad min. 70%
dno	236,7	232,3	234,5	78,2			
spolu	300	300	300	100,0			

Sledovaná vlastnosť			Výsledok	Skúšobný predpis	Kategória
Obsah jemných zŕn	f	% hmotn.	78,2	STN EN 933 - 1/A1	

Poznámka :

Použitie prístrojové vybavenie:
 Skúšobné sítá priemer 200 mm ev. č. : 002 - 015-Vi
 Elektronické váhy ev. č. : 001-Vi
 Preosievací prístroj ev. č. : 038-Vi
 Sušiareň s ventiláciou vzduchu ev. č. : 036-Vi

Vyhodnotenie: Výsledky skúšok vyhovujú uvedeným požiadavkám.

Výsledky skúšok sa týkajú iba uvedeného predmetu skúšky, nenahrádza iné dokumenty. Protokol o skúške môže byť reprodukován iba celým, v prípade jeho reprodukcie po častiach iba s písomným súhlasom vedúceho laboratória.

Schválil : vedúci laboratória Ing. Piroško-Kiráľ **Dňa :** 21.6.2019



Stanovenie zrnitosti (sitový rozbor) kameniva.

Postup skúšania podľa požiadaviek STN EN 933-1, 933-1/01


Objednávateľ: EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o.
Moyzesova 35, 010 01 Žilina

Lom: Hanišberg **Vzorka č.:** 147
Druh: DDK fr. 0/2 mm **Číslo zápisu o odbere:** 11/HAN/19
Miesto odberu: zo skládky **Dátum odberu:** 13.6.2019
Meno skúšajúceho: Ing. Knisa **Dátum dodania do laboratória:** 13.6.2019
Dátum skúšky: 13.6.2019

Skúška zrnitosti

Označenie sít (mm)	Ostatok (g)		Priemerný ostatok (g)	Priemerný ostatok (%)	Celkový prepad (%)	Percentuálny hmotnostný podiel prepadu				
	I	II				Požiadavka STN 13 043/AC			Kategória	
4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2D	100	-	100	G _F 85
2	31,5	23,5	27,5	9,2	90,8	D	89	-	99	G _{TC} 20
1	137,6	131,0	134,3	44,8	46,1	D/2	46	-	86	
0,5	49,3	53,4	51,4	17,1	29,0					G _F 85
0,25	20,6	23,6	22,1	7,4	21,6					
0,125	16,4	18,8	17,6	5,9	15,7					
0,063	15,6	18,5	17,1	5,7	10,0	0,063	4	-	10	G _{TC} 20
dno	3,6	4,1	3,9	1,3						
spolu	275	273	274	91,3						

SLEDOVANÁ VLASTNOSŤ		Výsledok skúšky	Skúšobný predpis	Kategória KLK	
Obsah jemných zŕn	f	% hmotn.	10,0	STN EN 933 - 1	f ₁₀

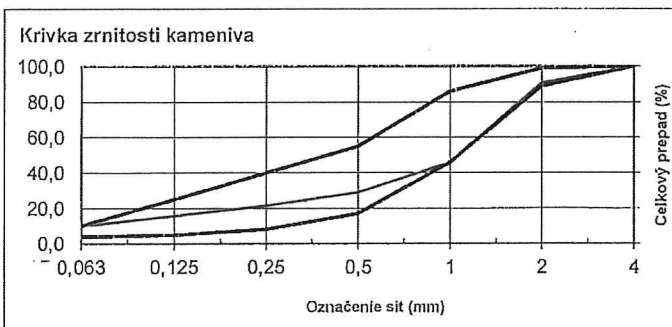

Hmotnosť celkovej navážky M ₁ (g)	
I	300
II	300
Hmotnosť zostatku na site 0,063 po premytí M ₂ (g)	
I	274,5
II	273,2
Podiel odplaviteľných častíc (%)	
I	8,5
II	8,9

Poznámka:

Súčet hmotností R_i a P sa nelíši o viac ako 1% z hmotnosti M₂, skúška je platná.

Rozdiel medzi R _i +P a M ₂ v %
0,0

Použité prístrojové vybavenie:

Skúšobné sítá priemer 200 mm : 002-015-Vi
Elektronické váhy Sartorius: 016-Vi
Laboratórna sušiareň: 036-Vi
Preosievací prístroj 038-Vi
Kvartovacie zariadenie -

Vyhodnotenie: Výsledky skúšok vyhovujú uvedeným požiadavkám.

Výsledky skúšok sa týkajú iba uvedeného predmetu skúšky, nenahrádza iné dokumenty. Protokol o skúške môže byť reprodukován iba celý, v prípade jeho reprodukcie po častiach iba s písomným súhlasom vedúceho laboratória.

Schválil: vedúci laboratória Ing. Piroško-Kiráľ

Dňa:

13.6.2019

Stanovenie zrnitosti (sitový rozbor) kameniva

Postup skúšania podľa požiadaviek STN EN 933-1, 933-1/01

Objednávateľ: EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o.
Moyzesova 35, 010 01 Žilina

Lom: Hanišberg **Vzorka č.:** 195
Druh: HDK fr. 2/5 mm **Číslo zápisu o odbere:** 13/HAN/19
Miesto odberu: zo skládky **Dátum odberu:** 4.7.2019
Meno skúšajúceho: Ing. Knisa **Dátum dodania do laboratória:** 4.7.2019
Dátum skúšky: 4.7.2019


Skúška zrnitosti

Označenie sít (mm)	Ostatok (g)		Priemerný ostatok (g)	Priemerný ostatok (%)	Celkový prepad (%)	Percentuálny hmotnostný podiel prepadu		Kategória
	I	II				Požiadavka STN EN 13043/AC		
11	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2D	100 - 100	G _C 90/15
8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1,4D	98 - 100	
5	7,9	9,2	9	1,2	98,8	D	90 - 99	
4	142,8	162,8	153	21,8	76,9	D/1,4	50 - 80	G _{25/15}
2	495,4	463,8	480	68,5	8,4	d	0 - 15	G _C 90/15
1	40,8	48,2	45	6,4	2,1	d/2	0 - 5	
0,063	9,7	11,7	11	1,5	0,5			
dno	3,2	4,4	4	0,5				
spolu	700	700	700	100,00				

Výsledok skúšky	Skúšobný predpis	Kategória KLK 1/2012
0,5	STN EN 933 - 1	f ₁

SLEDOVANÁ VLASTNOSŤ

Obsah jemných zŕn	f	% hmotn.	0,5	STN EN 933 - 1	f ₁

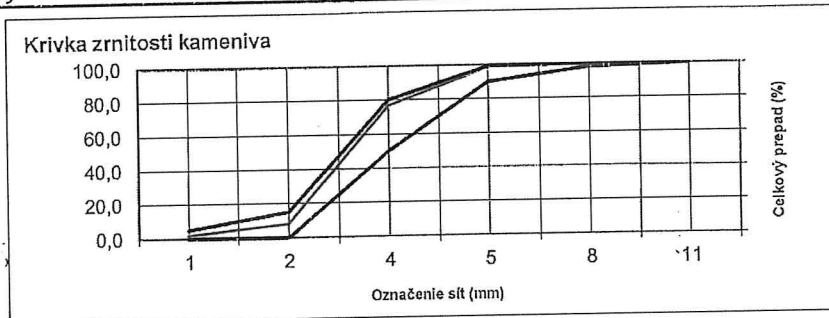

Poznámka:

Použité prístrojové vybavenie:

Skúšobné sítá priemer 200 mm : 002-015-Vi
Elektronické váhy Sartorius: 016-Vi
Laboratórna sušiareň: 036-Vi
Preosievací prístroj: 038-Vi
Kvartovacie zariadenie: -

Vyhodnotenie: Výsledky skúšok vyhovujú uvedeným požiadavkám.

Výsledky skúšok sa týkajú iba uvedeného predmetu skúšky, nenahrádza iné dokumenty. Protokol o skúške môže byť reprodukován iba celý, v prípade jeho reprodukcie po častiach iba s písomným súhlasom vedúceho laboratória.



Schválil: vedúci laboratória Ing. Piroško-Kiráľ

Dňa: 4.7.2019

Stanovenie zrnitosti (sitový rozbor) kameniva. Stanovenie tvaru zrn (tvarový index)

Postup skúšania podľa požiadaviek STN EN 933-1, 933-4, 933-1/01


Objednávateľ: EUROVIA SK, a.s., závod Obaľovne, OC Beladice
Partizánska 681/26, 058 01 Poprad

Lom: Pohranice **Vzorka č.:** 224
Druh: HDK fr.4/8 mm **Číslo záznamu o odbere:** 67/K/Be/19
Miesto odberu: zo skládky v OC **Dátum odberu:** 11.6.2019
Meno skúšajúceho: Kolesár **Dátum dodania do laboratória:** 11.6.2019
Dátum skúšky: 14.6.2019

Skúška zrnitosti

Označenie sít (mm)	Ostatok (g)		Priemerný ostatok (g)	Priemerný ostatok (%)	Celkový prepad (%)	Percentuálny hmotnostný podiel prepadu		Kategória
	I	II				Požiadavka STN EN 13043/AC		
16			0,0	0,0	100,0	2D	100 - 100	G _C 90/15
11			0,0	0,0	100,0	1,4D	98 - 100	
8	16,8	24,6	21	3,2	96,8	D	90 - 99	
5,6	270,5	271,3	271	42,2	54,6	D/1,4	25 - 55	G ₂₅ /15
4	258,3	265,9	262	40,8	13,8	d	0 - 15	G _C 90/15
2	80,7	79,2	80	12,4	1,4	d/2	0 - 5	
0,063	5,9	6,2	6	0,9	0,4			
dno	2,7	3,0	3	0,4				
spolu	635	650	643	100,00				

SLEDOVANÁ VLASTNOSŤ			Výsledok skúšky	Skúšobný predpis	Kategória KLK 1/2012
Obsah jemných zrn	f	% hmotn.	0,4	STN EN 933 - 1	f ₁
Tvar hrubého kameniva - tvarový index	SI	% hmotn.	16	STN EN 933 - 4	SI ₂₀

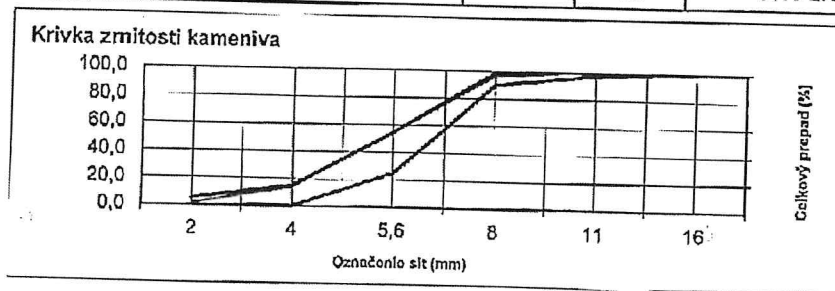

Poznámka:

Použité prístrojové vybavenie:

Skúšobné sítá priemer 200 mm : 001-014-Be
Elektronické váhy Sartorius: 020-Be
Laboratórna sušiareň: 031-Be
Preosievací prístroj: 029-Be
Kvartovacie zariadenie: -

Vyhodnotenie: Výsledky skúšok vyhovujú uvedeným požiadavkám.

Výsledky skúšok sa týkajú iba uvedeného predmetu skúšky, nenahrádza iné dokumenty. Protokol o skúške môže byť reprodukovany iba celý, v prípade jeho reprodukcie po častiach iba s písomným súhlasom vedúceho laboratória.

Schválil: vedúci laboratória Ing. Piroško-Kiráč

Dňa:

14.6.2019



Stanovenie zrnitosti (sitový rozbor) kameniva. Stanovenie tvaru zrn (tvarový index).

Postup skúšania podľa požiadaviek STN EN 933-1,933-1/01,933-4

Objednávateľ: EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. 128
Moyzesova 35, 010 01 Žilina

Lom: Hanišberg **Vzorka č.:** 9/HAN/19


Druh: HDK fr. 8/11 mm **Číslo zápisu o odbere:** 29.5.2019

Miesto odberu: zo skládky **Dátum odberu:** 29.5.2019

Meno skúšajúceho: Ing. Knisa **Dátum dodania do laboratória:** 29.5.2019
Dátum skúšky: 30.5.2019

Skúška zrnitosti

Označenie sít (mm)	Ostatok (g)		Priemerný ostatok (g)	Priemerný ostatok (%)	Celkový prepád (%)	Percentuálny hmotnostný podiel prepadu		Kategória
	I	II				Požiadavka STN EN 13043/AC		
22,4					100,0	2D	100 - 100	G _c 90/15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1,4D	98 - 100	
11	116	126	121	10,0	90,0	D	90 - 99	
8	930	943	937	77,3	12,7	d	0 - 15	
4	158	133	146	12,0	0,7	d/2	0 - 5	
0,063	4	3	3	0,3	0,4			
dno	6	5	5	0,4	0,0			
spolu	1214	1209	1211	100,00				
SLEDOVANÁ VLASTNOSŤ						Výsledok skúšky	Skúšobný predpis	Kategória
Tvar hrubého kameniva - tvarový index			Sl	% hmotn.		STN EN 933 - 4	Sl ₂₀	
Obsah jemných zrn			f	% hmotn.	0,4	STN EN 933 - 1	f ₁	

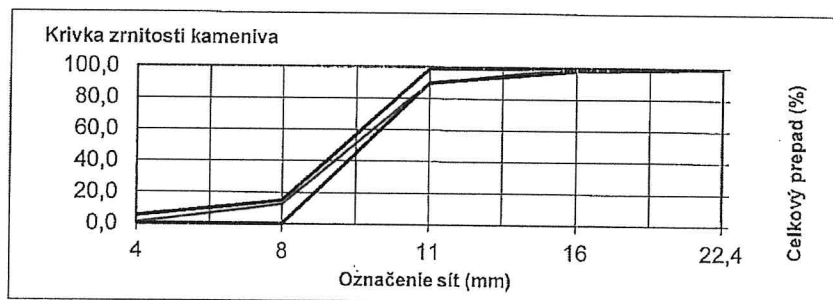

Poznámka:

Použité prístrojové vybavenie:

Skúšobné sitá priemer 200 mm : 002-015-Vi
Elektronické váhy Sartorius: 016-Vi
Laboratórna sušiareň: 036-Vi
Preosievací prístroj: 038-Vi
Kvartovacie zariadenie: -



Vyhodnotenie: Výsledky skúšok vyhovujú uvedeným požiadavkám.

Výsledky skúšok sa týkajú iba uvedeného predmetu skúšky, nenahrádza iné dokumenty. Protokol o skúške môže byť reprodukován iba celým, v prípade jeho reprodukcie po častiach iba s písomným súhlasom vedúceho laboratória.

Schválil: vedúci laboratória Ing. Piroško-Kiráľ

Dňa: 30.5.2019

Protokol č. **315/Be/2019**

Stanovenie zrnitosti (sitový rozbor) kameniva. Stanovenie tvaru zŕn (tvarový index).

Postup skúšania podľa požiadaviek STN EN 933-1,933-1/01, 933-4


Objednávateľ: EUROVIA SK, a.s., závod Obafovne, OC Beladice
Partizánska 681/26, 058 01 Poprad

Lom: Pohranice **Vzorka č.:** 315
Druh: HDK fr 16/22mm **Číslo zápisu o odbere:** 105/K/Be/19
Miesto odberu: zo skládky v OC **Dátum odberu:** 23.7.2019
Meno skúšajúceho : Ing. Knisa **Dátum dodania do laboratória :** 23.7.2019
Dátum skúšky: 23.7.2019

Skúška zrnitosti

Označenie sít (mm)	Ostatok (g)		Priemerný ostatok (g)	Priemerný ostatok (%)	Celkový prepád (%)	Percentuálny hmotnostný podiel prepádu		
	I	II				Požiadavka STN EN 13043/AC	Kategória	
45						2D	100 - 100	G _C 90/15
31,5			0,0	0,0	100,0	1,4D	98 - 100	
22,4	196	279	238	9,5	90,5	D	90 - 99	
16	1929	1846	1887	75,7	14,8	d	0 - 15	
8	362	324	343	13,7	1,1	d/2	0 - 5	
0,063	22	15	19	0,7	0,3			
dno	10	6	8	0,3	0,0			
spolu	2519	2470	2495	100,00				

SLEDOVANÁ VLASTNOSŤ		Výsledok skúšky	Skúšobný predpis	Kategória KLK
Tvar hrubého kameniva - tvarový index	SI	% hmotn.	STN EN 933 - 4	1/2012
Obsah jemných zŕn	f	% hmotn.	STN EN 933 -1	f ₁
		0,0		

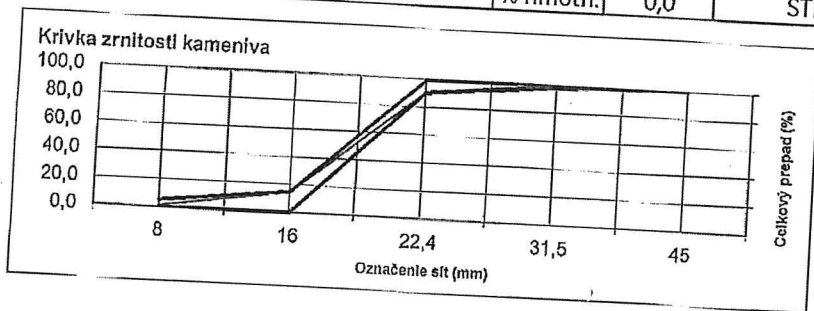

Poznámka:

Použité prístrojové vybavenie:

- Skúšobné sítá priemer 500 mm :
- Elektronické váhy Sartorius:
- Laboratórna sušiareň:
- Preosievací prístroj:
- Kvartovacie zariadenie:
- Posuvné meradlo dvojčelstvé:

Vyhodnotenie: Výsledky skúšok vyhovujú uvedeným požiadavkám.

Výsledky skúšok sa týkajú iba uvedeného predmetu skúšky, nenahradza iné dokumenty. Protokol o skúške môže byť reprodukovany iba celým prípadе jeho reprodukcie po častiach iba s písomným súhlasom vedúceho laboratória.



Schválil : vedúci laboratória Ing. Piroško-Kiráľ

Dňa : 23.7.2019

Stavba: **Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Nad Hrádzou, Nová Baňa**

Objekt: ulica Nad Hrádzou - Nová Baňa

Kontrolno-skúšobný plán

	Firma	Meno	Funkcia	Dátum	Podpis
Vypracoval:	EUROVIA SK, a.s.	Ing. Patrik Zummer	Kvalitár	26.7.2019	
Kontroloval:	EUROVIA SK, a.s.	Ing. Jaroslav Balák	Hl. stavbyvedúci	26.7.2019	
Schválil:					

Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Nad Hrádzou, Nová Baňa

P.č.	Popis položky	M.j.	Množstvo	Druh skúšky	Opis skúšky/merania	Skúška vykonávaná podľa	Početnosť skúšok	Početnosť skúšok/podľa požiadaviek	Spôsob predkladania	Zodpovedný za skúšky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Konštrukčná pláň (v miestach rozšírení vozovky)	m2	1 248	preukazná	vyhlásenie o parametroch, certifikát výrobu	Zákon č. 133/2013 Z.z.	1 x stavba	1	SCHP	VK
kontrolné				Edef,2/(min.60 Mpa); Edef,2/Edef,1(max. 2,5) statická zatažovacia skúška (resp. 3x LDD alebo 3x Troxler)	STN 73 6126 TKP 5/2014	1 sk./3000 m2	1	POS	AL	
				nerovnosť - priečna (max.40 mm)	TKP 5/2014	po 100 m	po 100 m	POS	AL	
				nerovnosť - pozdĺžna (max.30 mm)	TKP 5/2014	priebežne	priebežne	POS	AL	
				celistvosť povrchu	TKP 5/2014	vizuálne	priebežne	zápis v SD	SV	
2	Ochranná vrstva zo štrkopiesku (pôvodná vozovka)	m2	5 603	preukazná	vyhlásenie o parametroch, certifikát výrobu	Zákon č. 133/2013 Z.z.	1 x stavba	1	SCHP	VK
kontrolné				Edef,2/(min.100 Mpa); Edef,2/Edef,1(max. 2,5) statická zatažovacia skúška (resp. 3x LDD alebo 3x Troxler)	STN 73 6126 TKP 5/2014	1 sk./3000 m2	2	POS	AL	
				nerovnosť - priečna (max.20 mm)	TKP 5/2014	po 100 m	po 100 m	POS	AL	
				nerovnosť - pozdĺžna (max.20 mm)	TKP 5/2014	priebežne	priebežne	POS	AL	
				celistvosť povrchu	TKP 5/2014	vizuálne	priebežne	zápis v SD	SV	
3	Ochranná vrstva zo ŠD 0/63 mm hr. 500 mm (novovytváraná)	m2	1 248	preukazná	vyhlásenie o parametroch, certifikát výrobu	Zákon č. 133/2013 Z.z.	1 x stavba	1	SCHP	VK
kontrolné				Edef,2/(min.150 Mpa); Edef,2/Edef,1(max. 2,5) statická zatažovacia skúška (resp. 3x LDD alebo 3x Troxler)	STN 73 6126 TKP 5/2014	1 sk./3000 m2	1	POS	AL	
				Zrinitosť		1 skúška/1000 t	2	POS	AL	
				nerovnosť - priečna (max.20 mm)	TKP 5/2014	po 100 m	po 100 m	POS	AL	
				nerovnosť - pozdĺžna (max.20 mm)	TKP 5/2014	priebežne	priebežne	POS	AL	
4	Spojovací postrek 0,5 - 0,7 kg/m2	m2	6 851	preukazná	vyhlásenie o parametroch, certifikát	Zákon č. 133/2013 Z.z.	1 x stavba	1	SCHP	VK

Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Nad Hrádzou, Nová Baňa

P.č.	Popis položky	M.J.	Množstvo	Druh skúšky	Opis skúšky/merania	Skúška vykonávaná podľa	Početnosť skúšok	Početnosť skúšok/podľa požiadaviek	Spôsob predkladania	Zodpovedný za skúšky			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
5	Podkladná asfaltová vrstva AC 22 P, II., 50/70, hr. 60mm, STN 13 108-1	m2	1 248	kontrolné a preberacie	teplota zmesi (min 140°C)	TKP 6/2017	1sk/auto	1sk/auto	ZOP	SV			
					obsah spojiva (min. 4,0%)	TKP 6/2017	1 sk./500 t	1	POS	AL			
					zrinitosť	TKP 6/2017	1 sk./500 t	1	POS	AL			
					medzerovitosť (4,0-8,0%)	TKP 6/2017	1 sk./500 t	1	POS	AL			
					obj. hm. zhut. zmesi	TKP 6/2017	1 sk./500 t	1	POS	AL			
					pomer pevností v prieč. tahu (min. 60%)	KLAZ 1/2017	1 sk./3 000 t	1	POS	AL			
					TKP 6/2017 tab.15								
					miera zhutnenia (troxler) (min. 97%)	TKP 6/2017	1 sk./1000 m2	2	POS	AL			
					hrúbka vrstvy (max. 10% min. 0,90h)	TKP 6/2017	1 sk./2000 m2	1	POS	AL			
					nerovnosť - priečna (max. 12 mm)	TKP 6/2017	po 40 m	po 40 m	POS	AL			
6	Výstužná geomreža pre asfaltové vozovky	m2	1 818	preukazná	vyhlásenie o parametroch, certifikát	Zákon č. 133/2013 Z.z.	1 x stavba	1	SCHP	VK			
7	Obrusná asfaltová vrstva AC 11 O, II., 50/70, hr. 70mm, STN 13 108-1	m2	6 851	kontrolné a preberacie	teplota zmesi (min 140°C)	TKP 6/2017	1sk/auto	1sk/auto	ZOP	SV			
					obsah spojiva (min. 5,4%)	TKP 6/2017	1 sk./500 t	3	POS	AL			
					zrinitosť	TKP 6/2017	1 sk./500 t	3	POS	AL			
					medzerovitosť (2,5-4,5%)	TKP 6/2017	1 sk./500 t	3	POS	AL			
					obj. hm. zhut. zmesi	TKP 6/2017	1 sk./500 t	3	POS	AL			
					pomer pevností v prieč. tahu (min. 70%)	KLAZ 1/2017	1 sk./3 000 t	1	POS	AL			
					TKP 6/2017 tab.15								
					miera zhutnenia (troxler) (min. 97%)	TKP 6/2017	1 sk./1000 m2	7	POS	AL			
					Hrúbka vrstvy (≥ 1,0h)	TKP 6/2017	geodetický niveláciou	1 profil / 40 m	30	GP	ZG		
					nerovnosť - priečna (max. 5 mm)	TKP 6/2017	po 40 m	po 40 m	POS	AL			
nerovnosť - pozdĺžna (max. 5 mm)	TKP 6/2017	priebežne	priebežne	POS	AL								

Poznámky:

- 1) Skúška sa vykonáva len na prevzdušnených betónových zmesiacch
- 2) Skúška sa vykonáva len pre stupeň vplyvu prostredia XF1-XF4
- 3) Skúška sa vykonáva len pre stupeň vplyvu prostredia XF2 a XF4
- 4) Skúšku mrazuvzdornosti a max. priesaku vody (vodotesnosti) nie je potrebné vykonávať ak sa zrealizuje skúška odolnosti voči CHRL
- 5) Skúška sa vykonáva len pre stupeň vplyvu prostredia XF2 - XF4 a XA1 -XA3
- 6) Skúška sa vykonáva len pre stupeň vplyvu prostredia XA1 -XA3

Legenda:
 AL - akreditované laboratórium
 ZG - zodpovedný geodet (autorizovaný)
 SV - stavbyvedúci
 SP - špecialista
 SK - špecialista kvality

POS - protokol o skúške
 POG - protokol zodpovedného geodeta
 T - technik - TDI
 SD - stavebný denník
 PST - preukazná skúška

VK - vedúci kvality
 SCHP - schvaľovací protokol
 PAL - protokol AL
 GP - geodetický protokol
 ZOP - záznam o pokládke

RT - revízný technik



HDI Versicherung AG,
organizační složka
Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2

Tel.: +420-220 190 210
Fax: +420-220 190 298
monika.borkovcova@hdiczech.cz

Potvrzení o pojištění odpovědnosti

Toto potvrzení o pojištění slouží výlučně k informačním účelům a nepřenáší na majitele tohoto potvrzení žádná práva. Toto potvrzení nedoplňuje, nerozšiřuje ani nemění pojistné krytí níže uvedené pojistné smlouvy.

Pojistitel:	HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Rakouská republika, jednající prostřednictvím HDI Versicherung AG, organizační složka Jugoslávská 620/29 120 00 Praha 2 IČO 279 36 062
Pojistník:	EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10 110 00 Praha 1 IČO 452 74 924
Pojištění:	EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10 110 00 Praha 1 IČO 452 74 924 EUROVIA Services, s.r.o. Národní 138/10 110 00 Praha 1 IČO 612 50 210 EUROVIA Kamenolomy, a.s. Londýnská 637/79a 460 01 Liberec XI – Růžodol IČO 270 96 670 VČO – Východočeská obalovna, s.r.o. Kutnohorská 227 500 04 Hradec Králové - Plačice IČO 259 47 800 Liberecká obalovna, s.r.o. Hrádecká 247 460 01 Liberec XXXIII - Machnín IČO 622 45 589 EUROVIA Silba, a.s. Lobezská 1191/74 326 00 Plzeň – Lobzy IČO 648 30 551 GJW Praha spol. s r.o. Mezitraťová 137 198 21 Praha 9 - Hloubětín IČO 411 92 869

SILASFALT s.r.o.
Štěpaňákova 693/14
719 00 Ostrava - Kunčice
IČO 623 02 370

Jihočeská obalovna, spol. s r.o.
370 01 Planá 76
okres České Budějovice
IČO 608 27 823

OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o.
Letkov 171
326 00 Plzeň
IČO 497 90 633

OMT – Obalovna Moravská Třebová, s.r.o.
Borušov č.p. 1
571 01 Moravská Třebová
IČO 274 85 650

VDZ S.A.R., s.r.o.
Národní 138/10
110 00 Praha 1
IČO 257 41 829

Pražská obalovna Herink, s.r.o.
Herink 26
251 01 Říčany u Prahy
IČO 288 88 995

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
Na Důchodě čp. 1674
500 02 Hradec Králové
IČO 492 85 092

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO 31 651 518

EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice – Barca
IČO 36 574 988

EUROVIA Services, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO 45 338 159

Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o.
783 47 Hněvotín 431
IČO 283 40 710

UNIASFALT s.r.o.
919 09 Šelpice 136
IČO 44 557 051

	<p>PREFA PRO, a.s. Královická 267 250 01 Zápy IČP 030 87 344</p> <p>Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4 - Nusle</p> <p>Hlavné mesto SR Bratislava</p> <p>Slovenská správa ciest Bratislava Miletičova 19 823 19 Bratislava IČ 000 03 328</p> <p>Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlýnské Nivy 45 821 09 Bratislava IČO 359 19 001</p> <p>Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 01 Pardubice</p> <p>Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové</p>
Pojistná smlouva č.:	2100714
Limit pojistného plnění:	EUR 10.000.000,- - pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období
Rozsah krytí:	<ul style="list-style-type: none">- odpovědnost za újmu způsobenou provozní činností- odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku- pojištění regresů zdravotních pojišťoven- pojištění odpovědnosti za újmu na věcech užívaných- pojištění odpovědnosti za újmu na pronajatých nemovitých hmotných věcech- pojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých- pojištění odpovědnosti z držby nemovitých hmotných věcí- pojištění odpovědnosti za věci zaměstnanců- pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu- pojištění křížové odpovědnosti- pojištění subdodavatelů pojištěného

HDI

Spoluúčast:	EUR 10.000,- pro každou pojistnou událost
Územní rozsah pojištění:	Celý svět s výjimkou území USA a Kanady
Doba pojištění:	1.1.2019 – 1.1.2020

V Praze, dne 17.12.2018

HDI Versicherung AG
organizační složka
Verkehrsministerium
organizační složka
IČ: 276 36 062
120 00 Praha 2, Jungmannova 29
tel.: 220 100 210

HDI

①

Versicherung AG,
Organisationsstruktur

IO: 270 50 000

120 00 Praha 2, Jilovského 4, 20

tel: 220 100 210

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **114229554-118291-181218152757**, skládající se z **5** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LUCIE FOUKALOVÁ**

Vystavil: **Foukalová Lucie - notářka**

Pracoviště: **JUDr. Foukalová Lucie - notářka**

V Praze dne 18.12.2018



Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slsp.sk

tel.č. 02/ 486 26258
obchodne.financovanie@slsp.sk

Technické služby mesta Nová Baňa
Dlhá lúka 18
968 26 Nová Baňa
IČO: 00 185 221

Bratislava
23.7.2019

Záruka č. 959/CC/16 – BG289

Spoločnosť EUROVIA SK, a.s., so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31 651 518, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č.: 248/V (ďalej „Príkazca“) uzatvorí s objednávateľom, ktorým je: Technické služby mesta Nová Baňa, so sídlom: Dlhá lúka 18, 968 26 Nová Baňa, IČO: 00 185 221 (ďalej „Beneficiant“) Zmluvu o dielo (ďalej „Zmluva“), ktorej predmetom je realizácia stavebných prác vrchnej stavby miestnej komunikácie v rámci zákazky: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie – ul. Nad Hrádzou, Nová Baňa“ v celkovej výške EUR 128.000,- bez DPH (ďalej „Dielo“).

Príkazca má zabezpečiť splnenie svojich záväzkov podľa Zmluvy a splnenie povinnosti odstrániť Beneficiantom uplatnené vady na Diele počas záručnej doby podľa Zmluvy vystavením bankovej záruky.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka“), vystavuje z príkazu Príkazcu

v prospech Beneficianta Záruku
maximálne do výšky Záručnej sumy:

6.400,- EUR

slovom: šesťtisíc štyristo 00/100 euro.

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Beneficianta súhrne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Beneficianta. Obsahom písomnej výzvy Beneficianta bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Beneficianta, že:

- (i) Príkazca si nesplnil svoje záväzky voči Beneficiantovi zo Zmluvy spolu s upresnením porušenia záväzkov Príkazcu a/alebo
- (ii) Príkazca si nesplnil svoju povinnosť odstrániť Beneficiantom uplatnené vady na Diele počas záručnej doby v súlade s podmienkami Zmluvy, spolu so špecifikáciou neodstránených vád (ďalej „Výzva“).

Banka je oprávnená, nie však povinná, posudzovať predložené dokumenty z pohľadu, či tieto dokumenty spĺňajú alebo nespĺňajú právnym poriadkom alebo zmluvou stanovené náležitosti pre takéto dokumenty.

Banka uspokojí Beneficianta vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 5 pracovných dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky na adresu:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Oddelenie Obchodné financovanie a financovanie pohľadávok

Tomášikova 48,

SLOVENSKÁ 
sporiteľňa

IČO: 00151653, DIČ: 2020411536, IČ DPH: SK7020000262,
obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo
601/B
